ТЕСТОВОЕ · БИЗНЕС-АНАЛИТИК + PROJECT MANAGER

ИИ-помощник по складу и закупкам спа-оператора

Пилот MVP, 2 месяца. Автозаказ не входит в scope.

Задача пилота — не «умный чат», а поддержка решения управляющего: собрать данные, посчитать потребность прозрачной формулой, показать риски и оставить заказ человеку. ИИ объясняет расчёт, а не придумывает остатки и цены.



Рис. 1. С кем говорим в первую очередь и за что каждый отвечает в пилоте.

1. Вопросы стейкхолдерам

№	Вопрос	Кому	Зачем	Какой риск закрываем
1	Какие 20–40 позиций останавливают процедуры, если их нет завтра?	Управляющий объекта, администратор склада	Сузить пилот до критичного ассортимента	Расползание MVP на весь справочник
2	Где сейчас «истина» по остаткам и партиям, и как часто она расходится с фактом?	Администратор склада, ИТ-команда ABS	Оценить качество входных данных	Ложные рекомендации из неверного остатка
3	Срок поставки, минимальная партия и кратность по ключевым позициям?	Специалист по закупкам	Считать дату размещения заказа, не только «надо купить»	Рекомендация приходит позже точки заказа
4	Есть ли календарь загрузки и сезонность или сейчас считают среднее «на глаз»?	Управляющий объекта	Выбрать модель прогноза	План мимо пика сезона или простоя
5	Какой лимит на месяц и квартал и кто утверждает сверх лимита?	Финансовый менеджер, управляющий	Сделать пересчёт бюджета рабочим, не игрушечным	План непригоден для финансового контура
6	Какая доля списаний и почему: срок годности, перезаказ, смена линейки?	Администратор склада, финансовый менеджер	Понять, окупается ли сценарий FEFO	Делаем только дефицит и пропускаем дыру в деньгах
7	Кто сегодня решает «заказать N» и где это фиксируется?	Специалист по закупкам, управляющий	Заложить роли и журнал решений	Пилот не встраивается в контур ответственности
8	Какие поля ABS уже выгружаются: остаток, партия, цена, открытый заказ, СГ?	ИТ-команда ABS	Отделить интеграцию от ручной загрузки Excel	Срок пилота съедается интеграцией
9	Какая ошибка ИИ неприемлема: занизить критичное, завысить бюджет, предложить просрочку?	Управляющий, финансовый менеджер	Задать ограничения агента	Потеря доверия с первой недели
10	Кто пользуется пилотом каждый день и сколько минут на это есть?	Управляющий объекта, администратор склада	Собрать UX под реальный ритуал работы	Системой не пользуются

2. Процесс: риск дефицита и рекомендация заказа

Беру этот процесс, а не квартальный бюджет: если 14-дневный контур не работает, квартальный план не на чем строить.



Рис. 2. Что ломается сейчас и что меняет MVP.

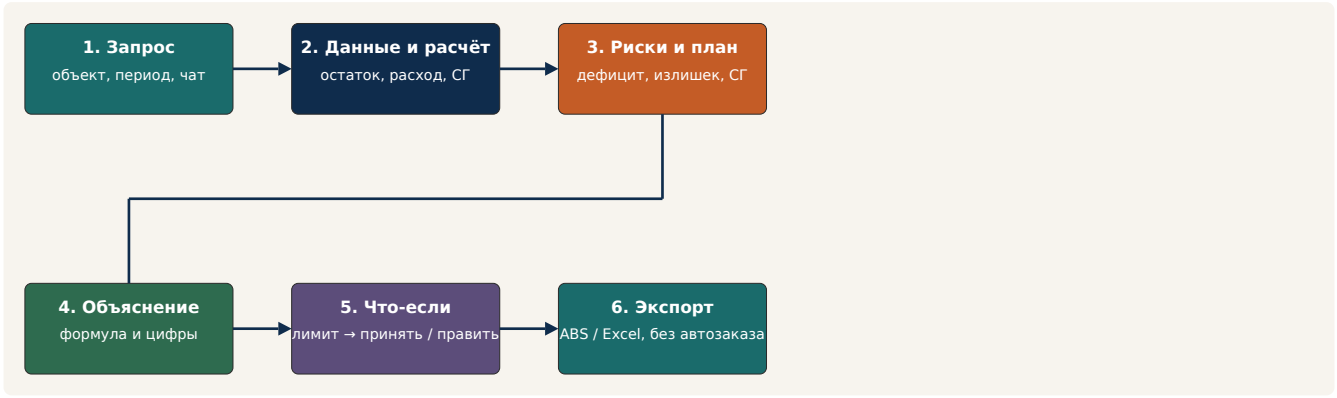


Рис. 3. Сценарий «риск дефицита → рекомендация заказа». Автозаказ выключен. Нет поля — «недостаточно данных».

Как считаем



- Прогноз расхода — среднее за N дней, при наличии календаря умножаем на загрузку объекта.
- Доступно — годные партии (FEFO) + ожидаемые поставки до потребности.
- Точка заказа — прогноз × (срок поставки + страховые дни). Если доступно меньше — риск дефицита.
- Объём и сумма — потребность на 14 дней + страховой запас − доступно, с кратностью поставщика; сумма сверяется с лимитом.
- Списание — партия истекает раньше, чем её израсходуют. Тогда не докупаем, а тратим FEFO.

3. Дорожная карта пилота — 8 недель

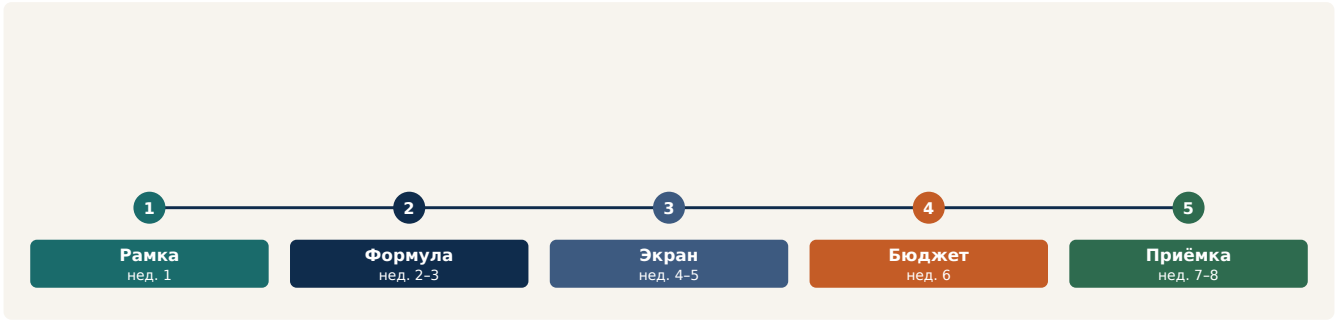


Рис. 4. Пять вех. Не идём в UI, пока формула не сходится вручную на 5 SKU.

Веха	Когда	Готово, если…	Кто
Рамка	Нед. 1	Объект, 20–40 SKU, источники данных, out of scope, ответы на вопросы выше	BA/PM, управляющий, ИТ
Данные и формула	Нед. 2–3	Словарь полей. Формула сходится вручную на 5 позициях. Список пробелов в данных	BA, склад, закупки
MVP на экране	Нед. 4–5	Таблица рекомендаций, объяснение, 8–10 вопросов в чате, экспорт. Без автозаказа	Dev, BA
Что-если и бюджет	Нед. 6	Пересчёт при смене лимита и горизонта. Сводка на 14 дней, месяц и квартал (квартал — проекция той же модели)	Dev, финансы
Обкатка и приёмка	Нед. 7–8	5 рабочих дней живых решений. Протокол по сценариям ниже. Решение go / доработать / стоп	Управляющий, спонсор

Два риска, которые закладываю сразу

Риск	Что делаем	План Б
Грязные остатки и партии	Пилот только на SKU с полными полями. Флаг «доверие к данным» на карточке	Ручной остаток на день расчёта с пометкой «не из ABS»
ИИ выдумывает цифру	Любое число только из расчётного слоя. Нет поля — отказ, не оценка «на глаз»	Отключаем чат, оставляем таблицу

4. Как поймём, что MVP работает

Сценарий	Что измеряем	Как измеряем	На каких данных	Критерий приёмки
Заказ на 14 дней	Время до ответа и покрытие критичных SKU	Секундомер + чек-лист: остаток, прогноз, точка заказа, объём, дата, сумма либо явный пробел	Срез остатков и расход 30–90 дней по пилотному объекту	100% критичных SKU за ≤ 5 мин; ни одного числа без источника
Дефицит до поставки	Доля пойманных прошлых дефицитов	Ретро: факт «позиция кончилась раньше прихода» сравниваем с сигналом модели на дату D	История остатков, расхода и дат прихода	Большая часть критичных срывов поймана; ложные тревоги разобраны, не скрыты
Срок годности	Партии, которые не успеют израсходовать до СГ	Список партий, где прогноз расхода < остатка до даты СГ. Склад подтверждает риск	Партии, сроки годности, расход	Риск показан по пилотным SKU с партиями; нет совета докупить избыток по СГ
Квартальный план и лимит	Сходимость суммы, разбивка по месяцам, читаемость дельты к прошлому периоду / лимиту	План = Σ(объём × цена) по месяцам 1–3. Дельта раскладывается: спрос / цена / расход / страховой запас. Смена лимита даёт пересчёт	Цены, объёмы, лимит квартала, факт прошлого квартала если есть	Сумма сходится. Видны месяц / категория / товар. Причина роста бюджета читается без аналитика рядом. Полугодие и год в пилоте — та же проекция, не отдельная модель
Вопрос на русском	Корректность ответа чата	10 вопросов из user stories ТЗ. Оценка: таблица + исходные поля либо отказ «недостаточно данных»	Тот же расчётный слой, что и экран	≥ 8/10 верны; 0 выдуманных остатков и цен

5. Как работаем с заказчиком и разработкой

С кем	Как часто	О чём говорим
Спонсор / финансы	Раз в 2 недели, 20 мин, 1 слайд	Статус, риск, что нужно от руководства
Управляющий и склад	2 раза в неделю с 5-й недели — у экрана	Три живые позиции: рекомендация верная?
Разработка и ИТ ABS	Стендап 15 мин × 3, груминг раз в неделю	Что блокирует расчёт и что режем, чтобы успеть демо

Аналитик и PM в одном лице, но в сообщениях не смешиваю. Аналитик: гипотеза → данные → формула → приёмка. PM: рамка, приоритет, «что не делаем на этой неделе». Scope меняется только заменой: новая фича = что вылетает из 8 недель.

6. Мотивация участия в проекте

Почему интересен этот проект. В первую очередь тем, что даёт испытать себя в полноценной роли аналитика и проджект-менеджера и, применяя эти роли, поучаствовать в реальном кейсе.

Как вижу свою роль. Основные рабочие роли — бизнес-аналитик и project manager. Помимо них вижу себя полезным для команды как человек, который поддерживает общий дух в минуты затруднения и держит рабочий позитив.

Сколько времени готов уделять. 40 часов в неделю — столько, сколько потребуется проекту.
